


Дата 16.12.2025 № ИК161225-03

Генеральному директору

Уважаемый [REDACTED]!




Направляем в Ваш адрес коммерческое предложение на поставку рамы под установку накопителей энергии:

Наименование	Кол-во, шт.	Цена за шт., руб. с НДС 20%	Стоимость всего, руб. с НДС 20%
Рама высотой 1500мм под контейнер 20 футов	1	[REDACTED]	[REDACTED] = 4 [REDACTED]
Рама высотой 1500мм под контейнер 40 футов	1	[REDACTED]	[REDACTED]
Итого ВСЕГО:			[REDACTED]





В коммерческом предложении учтены или не учтены следующие работы:



- Изготовление рамы.
Учтено.
- Доставка и строительно-монтажные работы.
Не учтено.
- Условия оплаты:
Аванс 50% в течение 5 банковских дней после подписания договора (возможны другие условия оплаты при подписании договора); Остаточный платеж за изделия в течение 5 банковских дней с момента извещения о готовности изделий к отгрузке.
- Сроки выполнения работ.
Срок производства ВСЕГО ОБЪЁМА (~800 площадок) составляет 25–40 рабочих дней. Первая отгрузка через 10 календарных дней.

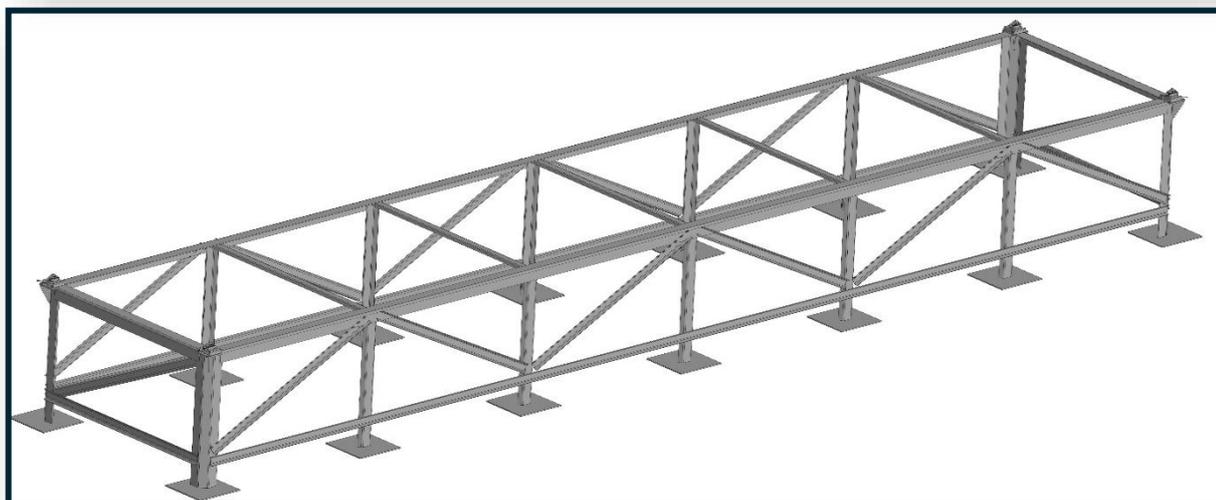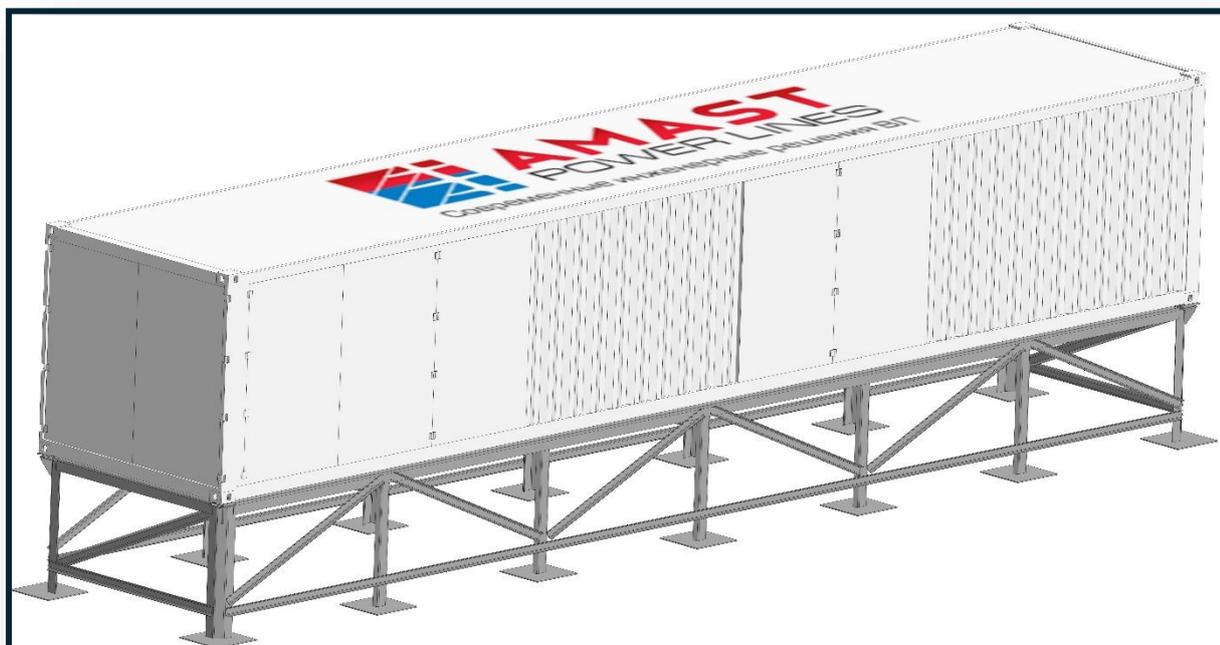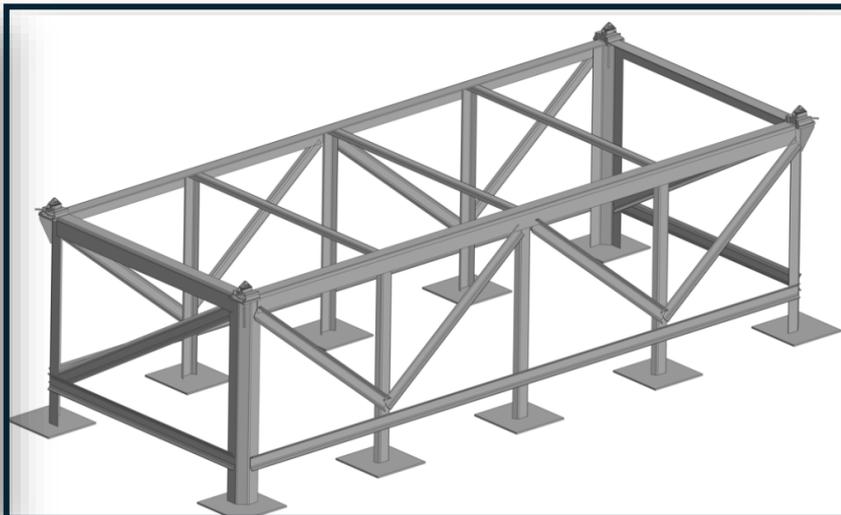

Техническое решение:

Решение на раме	Решение на сваях
Простое основание без свай – сделали небольшой котлован и засыпали «пирог»	Сваи на высоту 1,5 м крайне сложно установить в правильное положение, отклонения приведут к подгонке рамы и доп. сварочным работам по месту
Заводская болтовая рама, на площадке — только сборка на болтах, без «творчества» сварщиков.	Всё варится на площадке
Нет сложного бурения и массовых доработок по месту, а работы и объёмы понятны заранее	Переделки свай и рамы практически невозможно точно заложить в график и смету, каждая рама – почти как индивидуальный проект
Типовая рама и повторяемый «пирог» - быстро масштабировать	
Все решения понятны и зафиксированы в проекте, минимум «сюрпризов»	Большое количество буровых, бурильщиков и сварщиков, а также их наличие в период стройки, сильная зависимость от квалифицированного персонала
ВЫВОД: вместо уникальных конструкций на каждой площадке – типовое решение с заводским контролем качества, контролируемые сроки и минимальными рисками	ВЫВОД: при масштабном тиражировании свайного решения на десятки площадок, отклонения по геометрии и качеству сварки перетекают в существенные риски по срокам и бюджету

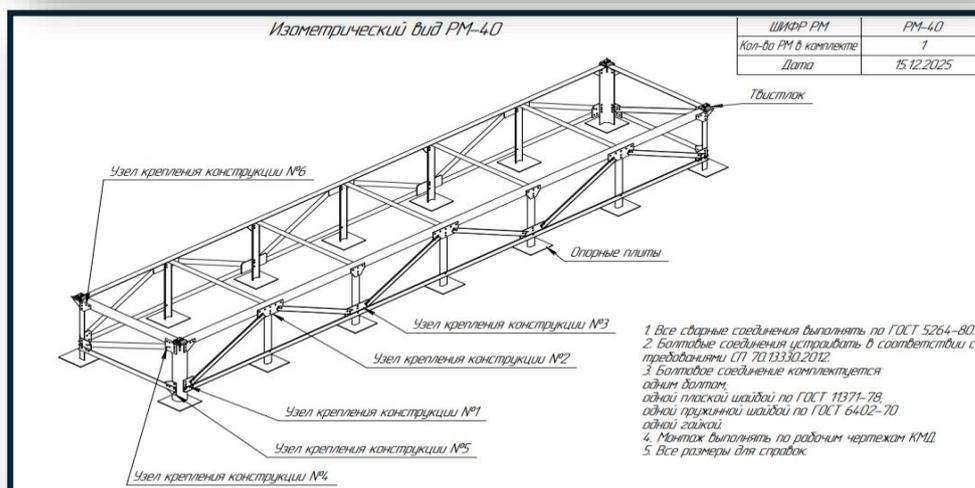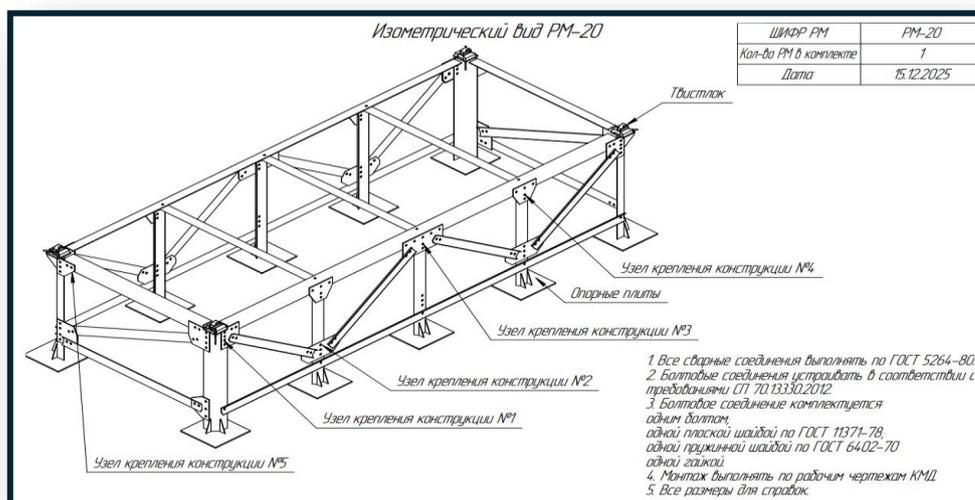

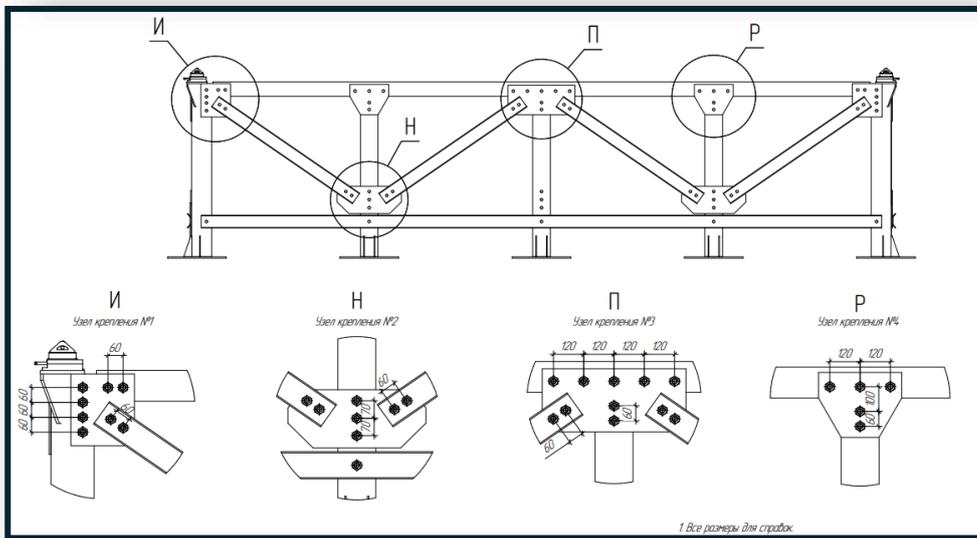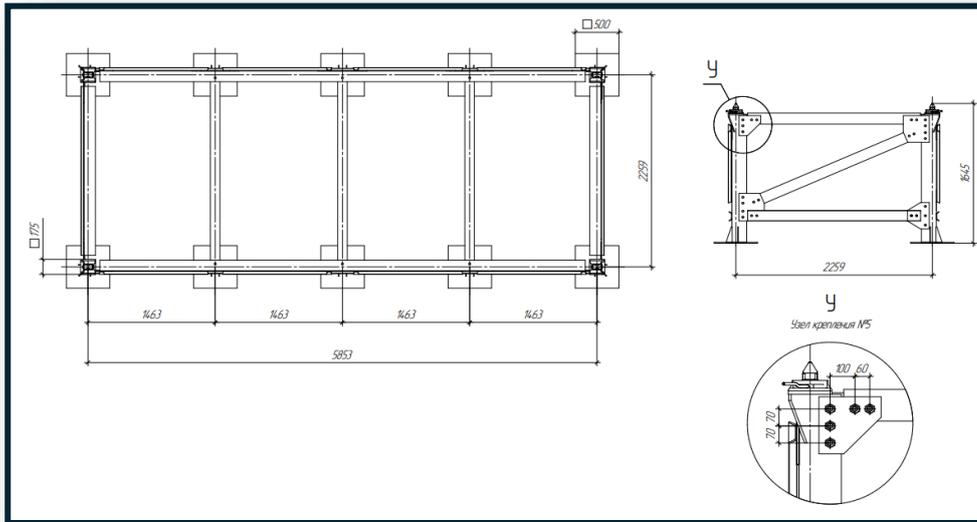

Примечание:

- 1) Коммерческое предложение составлено 16.12.2025г. и действует **14 календарных дней**;
- 2) В стоимость рамы не включены настилы, лестницы и переходные площадки.
- 3) [REDACTED]
- 4) [REDACTED] »

[REDACTED]
Зам. Генерального директора

[REDACTED]

[REDACTED]
